

# Projektprogramm vom 25.07.2008, Neubau Einfamilienhaus


Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	2. Quartal			3. Quartal			4. Quartal			1. Quartal			2. Quartal			3. Quartal			4. Quartal					
					04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
1																												
2	Bedürfnisse Auftraggeber	20t	Fre 02.05.08	Don 29.05.08				2.05.	20t																			
3	Lösungsmöglichkeiten	35t	Fre 30.05.08	Don 17.07.08				30.05.	35t																			
4	Vorprojektpläne, Modell 1:50	12t	Fre 18.07.08	Mon 04.08.08				18.07.	12t																			
5	Kostenschätzung ± 15%	12t	Fre 18.07.08	Mon 04.08.08				18.07.	12t																			
6	Vertrag Architekt	22t	Fre 18.07.08	Mon 18.08.08				18.07.	22t																			
7	Überarbeitung Vorprojektpläne	20t	Die 05.08.08	Mon 01.09.08				05.08.	20t																			
8	Abgabe Unternehmenssandliste zum Studium	0t	Mon 18.08.08	Mon 18.08.08				18.08.	◆																			
9	Baubeschrieb	20t	Die 05.08.08	Mon 01.09.08				05.08.	20t																			
10	Elektrovorprojekt	20t	Die 05.08.08	Mon 01.09.08				05.08.	20t																			
11	Vergabe Bauingenieur	0t	Mon 01.09.08	Mon 01.09.08				01.09.	◆																			
12	Provisorische Ausführungpläne	14t	Die 02.09.08	Fre 19.09.08				02.09.	14t																			
13	Ferien Marc	15t	Mon 22.09.08	Fre 10.10.08				22.09.	15t																			
14	Elektroprojekt für Submission	0t	Fre 10.10.08	Fre 10.10.08				10.10.	◆																			
15	Vorauswahl Sanitärapparate	0t	Fre 10.10.08	Fre 10.10.08				10.10.	◆																			
16	Vorauswahl Platten	0t	Fre 10.10.08	Fre 10.10.08				10.10.	◆																			
17	Überprüfen Materialwahl	0t	Fre 10.10.08	Fre 10.10.08				10.10.	◆																			
18	Vergabe Fachingenieure	0t	Fre 10.10.08	Fre 10.10.08				10.10.	◆																			
19	provisorisches Bauprogramm	5t	Mon 13.10.08	Fre 17.10.08				13.10.																				
20	Erstellen der Submissionsunterlagen	15t	Mon 13.10.08	Fre 31.10.08				13.10.	15t																			
21	Offerten bei Unternehmern	10t	Mon 03.11.08	Fre 14.11.08				03.11.	1t																			
22	Kontrolle, Vergleiche, Vergabeanträge	10t	Mon 17.11.08	Fre 28.11.08				17.11.	1t																			
23	Kostenvoranschlag nach Submission	0t	Fre 28.11.08	Fre 28.11.08				28.11.	◆																			
24	Bauprojekt	15t	Mon 01.12.08	Fre 19.12.08				01.12.	15t																			
25	Baueingabe	3t	Mon 22.12.08	Mit 24.12.08				22.12.	1t																			

Projekt: Projektprogramm.mpp  
Datum: Die 02.09.08



# Projektprogramm vom 25.07.2008, Neubau Einfamilienhaus

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	2. Quartal			3. Quartal			4. Quartal			1. Quartal			2. Quartal			3. Quartal			4. Quartal							
					04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
26	Bewilligungsverfahren	40t	Don 25.12.08	Mit 18.02.09																										
27	Definitive Auswahl Materialien	0t	Fre 09.01.09	Fre 09.01.09																										
28	Definitive Auswahl Küche (Lage Installationen)	0t	Fre 09.01.09	Fre 09.01.09																										
29	Definitive Auswahl Sanitärapparate	0t	Fre 09.01.09	Fre 09.01.09																										
30	Vergabe der Arbeiten	0t	Fre 09.01.09	Fre 09.01.09																										
31	Definitives Bauprogramm	5t	Fre 09.01.09	Don 15.01.09																										
32	Werkverträge	5t	Fre 16.01.09	Don 22.01.09																										
33	definitive Ausführungspläne	60t	Fre 09.01.09	Don 02.04.09																										
34	Ausführung	139t	Die 07.04.09	Fre 16.10.09																										
35	Definitive Auswahl Platten	0t	Mon 01.06.09	Mon 01.06.09																										
36	Definitive Auswahl Parkett	0t	Fre 07.08.09	Fre 07.08.09																										
37	Übergabe, Bezug	10t	Mon 19.10.09	Fre 30.10.09																										
38	Schlussabrechnung	5t	Mon 14.12.09	Fre 18.12.09																										
39	Dokumentation über das Bauwerk	5t	Mon 14.12.09	Fre 18.12.09																										

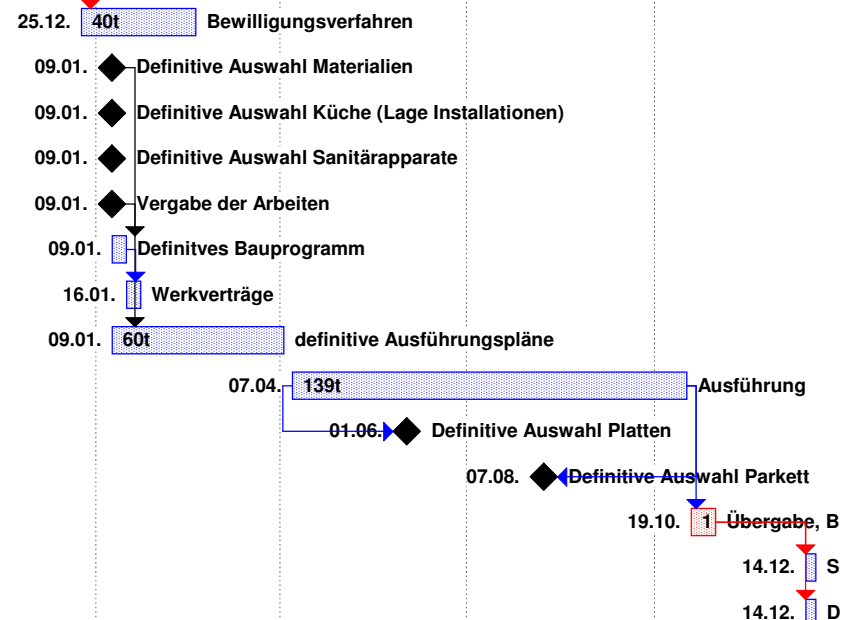

Projekt: Projektprogramm.mpp  
 Datum: Die 02.09.08

Vorgang		Meilenstein		Rollup-Vorgang		Rullup in Arbeit	
In Arbeit		Sammelvorgang		Rollup-Meilenstein			
